Bàn giao Sprint 1
Web quản lý chuỗi phòng tập Gym

Nhóm 6 · IT3180 · snapshot main 91a8b4a

Nhóm 6

Đại học Bách khoa Hà Nội

03/11/2026

DRAFT — theme default tạm. Nhóm chưa cung cấp mẫu Beamer HUST đã duyệt (issue #32).

Snapshot bàn giao

- Phạm vi nghiệp vụ và ERD v2 đã được nhóm chốt.
- Use case, activity và một wireframe đã có trong main.
- Mã hiện là khung FE/BE; đăng nhập thật và API nghiệp vụ còn làm.
- CI của snapshot 91a8b4a xanh; chưa có bằng chứng staging, Postman hay E2E.

Mốc cần nhớ

4 sprint · 20 chức năng · 6 vai trò
Bàn giao Sprint 1 dự kiến:
10/11/2026

Cách đọc slide

Sơ đồ là thiết kế; trạng thái code, PR và kiểm chứng được ghi riêng.

Nguồn: [bản chốt phạm vi] · [kế hoạch Sprint 1]

Phạm vi: 20 chức năng trong 5 version

Version	Nhóm chức năng	Cam kết
v1	F1–F6: tài khoản, hội viên, gói, check-in, thanh toán tại quầy, dashboard	Bắt buộc
v2	F7–F10: cổng hội viên, lớp nhóm, huấn luyện viên, thông báo	Bắt buộc
v3	F11–F17: thiết bị, POS/kho, nhân sự/lương, khuyến mãi, bảo lưu, báo cáo, audit log	Mục tiêu
v4	F18–F19: đa chi nhánh, gamification theo quy tắc	Mục tiêu; cắt thứ hai nếu trễ
v5	F20: nhận diện khuôn mặt tại quầy	Cắt đầu tiên nếu trễ

Ưu tiên

Dễ kiểm thử, dễ demo các nghiệp vụ quản lý. AI chỉ có nhận diện khuôn mặt ở v5; không làm app di động hay thanh toán online.

Nguồn: [bản chốt phạm vi]

Sáu vai trò sử dụng hệ thống

Nhân viên

- **Chủ chuỗi**: cấu hình và báo cáo toàn chuỗi.
- **Quản lý chi nhánh**: vận hành chi nhánh.
- **Lễ tân**: hồ sơ, check-in, bán và thu tiền tại quầy.
- **Huấn luyện viên**: lịch dạy, điểm danh và buổi PT.

Người dùng bên ngoài

- **Hội viên**: xem gói, đặt lớp/PT, nhận thông báo.
- **Khách**: xem giá, lịch lớp công khai, đăng ký.

Năm vai trò đăng nhập; Khách dùng trang công khai.

Phạm vi triển khai

v1–v3 dùng một chi nhánh mặc định; đa chi nhánh thuộc v4.

Yêu cầu bảo mật và chất lượng đã chốt

Bảo mật

- **S1**: bcrypt; mật khẩu từ 8 ký tự, có chữ và số.
- **S2**: access JWT 15 phút; refresh token trong cookie HttpOnly.
- **S3**: backend kiểm tra vai trò và quyền sở hữu trên mọi API; hội viên không xem dữ liệu người khác.

Chất lượng


- **NF4**: responsive từ 360 px; Chrome, Edge, Firefox bản mới.
- **NF6**: giao dịch có khóa bản ghi khi đặt lớp/PT; không vượt sĩ số hoặc trùng lịch dưới đồng thời.

Phân biệt

Đây là tiêu chí đã duyệt; chưa phải kết quả nghiệm thu.

Nguồn: [bản chốt phạm vi], mục S1–S3 và NF4/NF6.

Kiến trúc đích — chưa phải deployment đang chạy



Trạng thái hiện tại

Vercel/Render/Neon chưa có URL staging thật; cấu hình rewrite còn domain .invalid. Sơ đồ mô tả đường đi dự kiến theo ADR 0008.

Nguồn: [ADR 0008] · [cấu hình Vercel]

Dữ liệu: ERD v2 có 39 bảng, 8 nhóm

1. Tài khoản và hệ thống
2. Chi nhánh và cơ sở vật chất
3. Hội viên và gói tập
4. Check-in và lớp học
5. Huấn luyện viên
6. Bán hàng và thanh toán
7. Nhân sự
8. Gamification

Nguồn dữ liệu thiết kế

erd-v2.dbml là bản chuẩn; DBML Enum chỉ mô tả tập giá trị logic. CSDL vật lý dùng varchar + CHECK.

Báo cáo

Ảnh ERD và từ điển dữ liệu chưa xuất (issue #15); slide không dựng hình thay cho ERD.

[Mở DBML ERD v2] · [Issue #15]

Sơ đồ nghiệp vụ có trong main

Use case

Sơ đồ tổng quát và 6 phân rã theo actor: Chủ chuỗi, Quản lý chi nhánh, Lễ tân, Huấn luyện viên, Hội viên, Khách.

PR #38 đã merge.

Activity

Check-in tại quầy · tự động xử lý waitlist · đặt lịch PT.


PR #41 đã merge.

SRS đang có trên snapshot

F1, F2, F4, F6. SRS tổng quan #13 còn mở; đặc tả F8 đang ở PR draft #79, không nằm trong main.

[Use case] · [Activity] · [PR #79 F8]

Đăng ký hội viên — wireframe, PR #78 chưa merge




- Bản vẽ mobile rộng 360 px; nguồn vẫn là .drawio.svg chỉnh sửa được.
- Họ tên, email, SĐT, mật khẩu; không cho tự chọn role hoặc chi nhánh.
- SĐT đã có hồ sơ: từ chối và hướng dẫn liên hệ quầy, không tự gắn tài khoản.
- Đăng ký tài khoản chưa phải mua hay kích hoạt gói tập.

Hình là crop từ **wireframe**; không phải screenshot UI hoặc backend đang chạy.

[PR #78: đăng ký, bảng giá, lịch lớp]
Nguồn ghim tại commit 464a31a; CI tài liệu xanh, chưa có human review.

Lịch lớp công khai — wireframe, PR #78 chưa merge

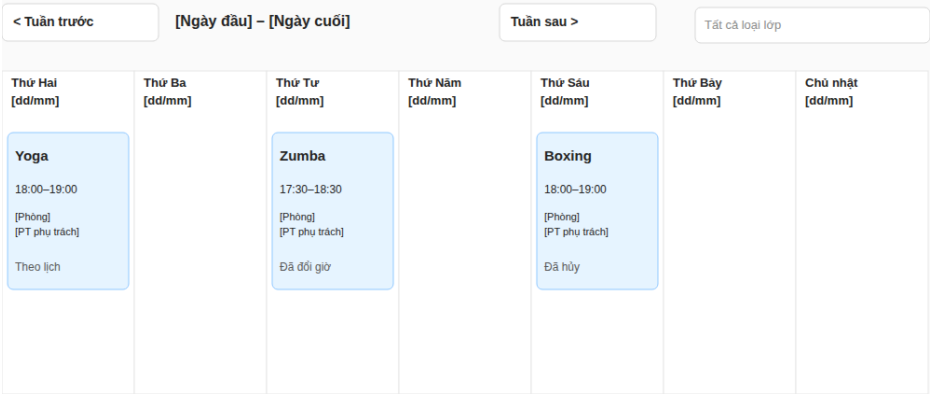

Khách xem lịch không cần tài khoản. Đặt lớp cần TIME ACTIVE hợp lệ; không công khai danh sách hội viên.

Crop bảng lịch từ sơ đồ editable commit 464a31a; không phải màn hình vận hành thật.
[PR #78 chưa merge] · Dashboard đã merge ở [PR #42].

Mã nguồn: khung đã có, nghiệp vụ còn đang làm

Frontend

Trên main: router/layout và đăng nhập giả lập. Trên PR #80 chưa merge: thay giả lập bằng adapter xác thực và token memory.

Backend

Spring Boot, cấu hình bảo mật và xử lý lỗi chung; feature API hội viên/gói tập chưa có trong snapshot.

Issue #30

PR nháp #80 có form đăng ký, login/refresh và menu theo role; backend thật còn chờ Đức Việt xác nhận DTO/API.

CSDL

Có Docker Compose và quy trình Flyway; migration nghiệp vụ chưa có trên snapshot này.

[Issue #30] · Snapshot checkout: main 91a8b4a. PR #80 chưa merge.

Bằng chứng hiện có — và giới hạn của bằng chứng

- CI run #41609330773: success trên main commit 91a8b4a.
- PR #80: local lint/build qua; Vitest 35 test qua; browser mock API ở 360/768/1280 px qua, không tràn ngang. CI #41646954979 xanh. Chưa kiểm thử backend thật.
- Tài liệu đã merge: PRs #34, #38, #40, #41, #42, #44, #45.
- PR #77 draft tạo 31 story (#46–#76) với 86 GWT; PR #78 wireframe và PR #79 SRS F8 đều đang mở, chưa review/merge, CI xanh.

Không suy diễn

CI green không phải bằng chứng E2E, Postman, bảo mật đạt yêu cầu hay hệ thống đã được deploy.

Phụ thuộc và rủi ro trước khi demo

- **Staging/Postman (#31):** chưa có URL live; vercel.json còn .invalid; không đưa link demo giả.
- **Schema/API:** migration và API F1–F3 theo issues #22, #25, #26, #28, #29 cần hoàn tất trước khi nối UI.
- **Tài liệu:** SRS tổng quan #13 và ảnh ERD/từ điển #15 còn phụ thuộc; F8 #79 đang review.
- **Giao diện:** PR #78 chưa merge; wireframe khác và UI thật vẫn theo phân công Sprint Plan.
- **Dependency audit baseline:** 13 moderate ở tooling ESLint/minimatch; không có high/critical.
- **Trình bày:** mẫu Beamer HUST chưa được cung cấp; bản này dùng default tạm, DRAFT trên mọi trang.
- **Quyền board:** chưa xác minh được GitHub Projects; status ở đây lấy từ issue/PR và Sprint Plan.

[Issue #31 staging] · [#13 SRS] · [#15 ERD] · [#32 mẫu Beamer]

Ma trận bàn giao — giữ nguyên người phụ trách

Hạng mục	Snapshot / đầu việc tiếp theo	Người theo Sprint Plan
SRS / truy vết	#13 tổng quan; F8 ở PR #79 chờ review	Nguyễn Anh Tú; Phạm Gia Bảo (F8)
ERD / dữ liệu	DBML đã duyệt; xuất ảnh + từ điển ở #15	Nguyễn Anh Tú
Stories / wireframe	#77 draft; #78 open; #17 còn mở	Phạm Gia Bảo và các chủ wireframe trong kế hoạch
Migration / API	Các issue #22/#25/#26/#28/#29 và kiểm thử theo WBS	Chủ issue/WBS trong Sprint Plan
UI đăng nhập	PR #80 nháp; mock tests qua, chờ API thật	Phạm Gia Bảo; phụ thuộc Bùi Trần Đức Việt
Staging / Postman	#31 còn mở, chưa có URL thật	Nguyễn Phú Trọng; Hoàng Kim Tiến hỗ trợ
Slide / rehearsal	Draft, hạn trong kế hoạch 09/11	Phạm Gia Bảo

Schema: V1/2 Đức Việt · V3 Lân · V4 Minh Quân · V5/7 Trọng Việt · V6/8 + FK Phú Trọng. API F1 Đức Việt; F2/F3 Lân. [Sprint Plan] · Không đổi phân công.

Việc cần chốt trước buổi trình bày 10/11

1. Cập nhật trạng thái theo PR/issue mới nhất; chỉ đưa vào “đã có” khi đã merge hoặc có bằng chứng kiểm tra phù hợp.
2. Hoàn tất schema/API và giao diện; triển khai Neon, Render, Vercel; thay placeholder, xác minh health.
3. Chạy Postman trên staging và ghi lại kết quả; không gọi CI là E2E.
4. Xuất ERD/từ điển từ DBML canonical; hoàn thành phần SRS/truy vết theo kế hoạch.
5. Thay theme tạm nếu nhóm cung cấp mẫu HUST được duyệt; rehearsal với một URL demo thật và đường lui bằng sơ đồ/wireframe.

Nguồn: [phạm vi] · [kick-off] · [kế hoạch Sprint 1] · [issue #32]
